

まちづくりニュース

(花月園競輪場跡地)



令和2年11月20日

発行：横浜市 環境創造局、都市整備局
UR都市機構 東日本都市再生本部

工事進捗状況と事業スケジュールの見直しについて

日頃から本事業に対するご理解とご協力をいただきありがとうございます。

これまで、市街地整備と公園整備を並行して施行し、令和2年度末の事業完了に向けて鋭意進めてきましたが、埋蔵文化財の調査や大型台風等による災害対応に加え、現在のコロナ禍の状況などにより、事業の遅延が避けられない状況となりました。

これまでどおりの市街地整備と公園整備を並行して進める方法では、事業の完了が全体で1年以上遅れることが見込まれるため、今後は地区公園を優先的に整備し、早期開園することを目指し、事業全体スケジュールを見直すこととしました。地区公園は令和3年秋頃の完成を目指し、工事を進めます。

事業の遅れとともに、皆様へのご説明が遅くなってしまったこと、大変申し訳ありません。引き続き、工事による騒音・振動等で、皆様にはご迷惑をおかけしますが、細心の注意を払い安全に進めていきますので、ご理解・ご協力をお願いします。

事業全体スケジュールの見直し(予定)

	2019 令和元年度	2020 令和2年度	2021 令和3年度	2022 令和4年度	2023 令和5年度	2024 令和6年度	2025 令和7年度
地区公園 公益的施設用地	[当初スケジュール: 2019-2021]						
	[変更後スケジュール: 2019-2022]						
宅地 集合住宅	[当初スケジュール: 2019-2021]						
		[変更後スケジュール: 2020-2022]				集合住宅建設工事	
自転車駐輪場 スロープ		[当初スケジュール: 2020-2021]					
				[変更後スケジュール: 2022-2023]			

凡例

[当初スケジュールの青い矢印] : 当初スケジュール

[変更後スケジュールの赤い矢印] : 変更後スケジュール

※スケジュールは整備予定を表しています。整備完了後、利用可能となる時期については、横浜市及びUR都市機構で調整し、改めてご案内します。

12m道路工事の施工について



地区隣接の市道の舗装工事を行います

今後、地区南側の12m道路終点部(裏面にある図面の⑥)と地区に接続する既設道路の舗装工事を行っていきます。

施工時期は、12月以降を予定しています。詳細な日程が決定しましたら、近隣の皆様にご案内をお配りします。

近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

地区内工事の整備状況について



①-1 ゾウさん広場に設置されたジャングルジムと複合遊具。



② 大原っぱの周回園路から見たゾウさん滑り台と大階段。



ゾウさん滑り台、右からパパぞう・ママぞう・子ぞう。



①-2 小さいお子さんも遊べる遊具・砂場。




④ 多目的広場に隣接する公園1内のブランコと複合遊具。



⑤ 公園南西部南側道路の法面。



③ 12m道路入口から見た大原っぱ周回園路と左上には防災ベンチが付くパーゴラ(日よけ)。

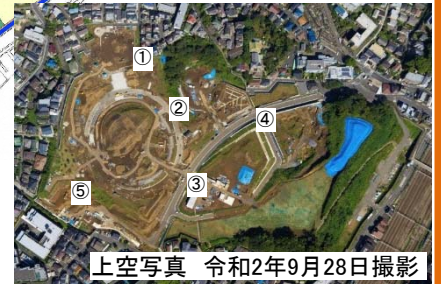

緑化プランターの花も、リニューアルしています



工事中の環境対策として設置した緑化プランターは、季節ごとにプランターの花も変化しています。先日、新しいお花に更新しました。ぜひご覧ください。

鶴見一丁目地区（花月園競輪場跡地）の状況はこちらでもご覧になれます
⇒<http://www.ur-net.go.jp/tsurumi>

【お問い合わせ先】

（（仮称）鶴見花月園公園の整備内容等について）

■横浜市環境創造局 公園緑地部 公園緑地整備課

電話 045-671-4611

（地区全体のまちづくりの考え方について）

■横浜市都市整備局 地域まちづくり部 地域まちづくり課

電話 045-671-2667

（地区全体の整備内容や事業スケジュール等について）

■UR都市機構 東日本都市再生本部

（計画関連）事業推進部 事業推進第2課

電話 03-5323-0589

（工事関連）基盤整備計画部 基盤統括課

電話 03-5323-0848

（工事について）

■UR都市機構 UR鶴見一丁目地区工事監督員事務所

電話 0120-454-081

電話 080-1036-0238
